

ANEXO - RESOLUCIÓN N° (- \$A5 M9D; 7 #%

NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. – ALTOTE S.A. – U.T.E. – ECOPARQUE
Maure 4039 – (1427) Buenos Aires-Argentina
Tel./fax: (5411) 4553-2600 / (5411) 4554-8519 / (5411) 4552-1073
naku@nakusrl.com

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018

Sres.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo
Av. Martín García 346 3° piso
Ciudad de Buenos Aires


Ref: Obra: "PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA
ECOPARQUE ZONA 1 B-LAS HERAS"
Licitación Pública N° 242/SIGAF/2018

De nuestra mayor consideración,

Por medio de la presente solicitamos una ampliación de plazo de 120 días para la obra de referencia, a fin de poder dar cumplimiento a los trabajos adicionales que fueron requeridos para el "Pabellón de las Fieras".

Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.


Ing. EDUARDO BARTOLOME OTERO MACHADO
REPRESENTANTE TECNICO
ALTOTE S.A.-NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.


Arq. Eduardo Curcio
Mat. -CPAU 21.793
C.º de Obra DGORU-MAYEP GCBA

IF-2019-06119875-GCABA-DGORU

NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. – ALTOTE S.A. – U.T.E. – ECOPARQUE
Maure 4039 – (1427) Buenos Aires-Argentina
Tel./fax: (5411) 4553-2600 / (5411) 4554-8519 / (5411) 4552-1073
naku@nakusrl.com

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018

Sres.
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Ministerio de Ambiente y Espacio Público
Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque Interactivo
Av. Martín García 346 3° piso
Ciudad de Buenos Aires

Ref: Obra: "PROYECTO EJECUTIVO Y OBRA
ECOPARQUE ZONA 1 B-LAS HERAS"
Licitación Pública N° 242/SIGAF/2018

De nuestra mayor consideración,

Por medio de la presente les remitimos plan de trabajos y curva de inversión correspondiente al presupuesto por los trabajos del "Pabellón de las Fieras" de la obra en referencia.

Sin otro particular, saludamos a Uds., muy atentamente.

Ing. EDUARDO BARTOLOME OTERO MACHADO
REPRESENTANTE TECNICO
ALTOTE S.A.-NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.


Arq. Eduardo Curcio
Mat. N.º 793
INSPECCION DE OBRAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - MAYEP GCBA

IF-2019-06119875-GCABA-DGORU

REPARTICIÓN: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Ministerio de Ambiente y Espacio Publico
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
OBRA: PROYECTO EJECUTIVO Y OBRAS ECOPARQUE ZONA 1 B - LAS HERAS

LICITACION N° : LP 242/SIGAF/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 11 MESES

PLAN DE TRABAJOS PARA LA ZONA 1B - LAS HERAS

Table with columns: ITEM N°, DESCRIPCION DE TAREAS, PRECIO TOTAL, INCID. EN %, REF., and 22 columns for MES 1 to MES 11. Includes sub-headers for 'ITEMS CERTIFICABLES EN PLAZO DE EJECUCION - EN QUINCENAS Y DÍAS CORRIDOS' and 'CERTIFICACIONES EN PESOS'. Includes handwritten signatures and stamps at the bottom.

IF-2019-06119875-GCABA-DGURU

REPARTICIÓN: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - Ministerio de Ambiente y Espacio Público
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS
 OBRA: ADICIONAL PROYECTO EJECUTIVO Y OBRAS ECOPARQUE ZONA 1 B - LAS HERAS
 ADICIONAL FELINERA
 LICITACION N° : LP 242/SIGAF/2018
 PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 MESES

PLAN DE TRABAJOS PARA LA ZONA 1B - LAS HERAS

ITEM N°	DESCRIPCION DE TAREAS	PRECIO TOTAL	INCID. EN %	REF.	ITEMS CERTIFICABLES EN PLAZO DE EJECUCION - EN QUINCENAS Y DÍAS CORRIDOS												
					ABRIL 2019		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		
					1 15	2 30	3 45	4 60	5 75	6 90	7 105	8 120	9 135	10 150	11 165	12 180	
1	Trabajos Preliminares	\$ 5.705.407,00	19,927%	% Item	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,000%
				% Obra	9,964%	9,964%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	19,93%
2	Demoliciones	\$ 2.972.562,68	10,382%	% Item	0,00%	10,00%	25,00%	25,00%	25,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,000%
				% Obra	0,000%	1,038%	2,596%	2,596%	2,596%	1,557%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	10,38%
3	Albañilería	\$ 5.228.900,03	18,263%	% Item	0,00%	0,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,000%
				% Obra	0,000%	0,000%	1,826%	3,653%	3,653%	3,653%	3,653%	1,826%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	18,26%
4	Pintura	\$ 1.842.701,70	6,436%	% Item	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,000%
				% Obra	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,609%	1,609%	1,609%	1,609%	6,44%
5	Carpintería y Herrería	\$ 5.763.438,99	20,130%	% Item	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,000%
				% Obra	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	5,032%	5,032%	5,032%	5,032%	0,000%	0,000%	0,000%	20,13%
6	Cubiertas	\$ 6.866.346,88	23,982%	% Item	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,000%
				% Obra	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	5,996%	5,996%	5,996%	5,996%	0,000%	0,000%	23,98%
7	Varios	\$ 251.773,13	0,879%	% Item	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	25,00%	100,000%
				% Obra	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,044%	0,088%	0,176%	0,220%	0,88%
CERTIFICACIONES EN %		\$ 28.631.130,41	100,00%		10,008%	11,046%	4,466%	6,292%	6,292%	10,286%	14,725%	12,898%	12,681%	7,692%	1,785%	1,829%	
CERTIFICACIONES EN PESOS																	
ACUMULADA					10,008%	21,053%	25,519%	31,811%	38,104%	48,390%	63,115%	76,013%	88,694%	96,386%	98,171%	100,000%	
PARCIAL					\$ 2.865.292,16	\$ 3.162.548,42	\$ 1.278.619,33	\$ 1.801.509,33	\$ 1.801.509,33	\$ 2.945.112,81	\$ 4.215.815,13	\$ 3.692.925,13	\$ 3.630.710,55	\$ 2.202.439,46	\$ 511.030,05	\$ 523.618,71	28.631.130,41
ACUMULADA					\$ 2.865.292,16	\$ 6.027.840,58	\$ 7.306.459,91	\$ 9.107.969,24	#####	\$ 13.854.591,39	\$ 18.070.406,52	\$ 21.763.331,64	\$ 25.394.042,19	\$ 27.596.481,65	\$ 28.107.511,70	\$ 28.631.130,41	

[Firma]
 Arq. Eduardo Curcio
 Mat. -CPAU 21.793
 Inspección de Obra DCSRU N° 11.111.111

[Firma]
 Ing. EDUARDO BARTOLOME OTERO MACHADO
 REPRESENTANTE TECNICO
 ALTOTE S.A.-NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.

IF-2019-06119875-GCABA-DGURU



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

**Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**

Número: IF-2019-06119875-GCABA-DGORU

Buenos Aires,

Lunes 18 de Febrero de 2019

Referencia: plan de trabajo, curva de inversión y ampliación de plazo

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.02.18 11:21:23 -03'00'

Antonella Carucho

Asesor legal

D.G. OBRAS DE REGENERACION URBANA (MAYEPGC)


MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.02.18 11:21:23 -03'00'

Obra y Proyecto Ecoparque Zona 1B - Las Heras Curva de Inversión por Quincenas

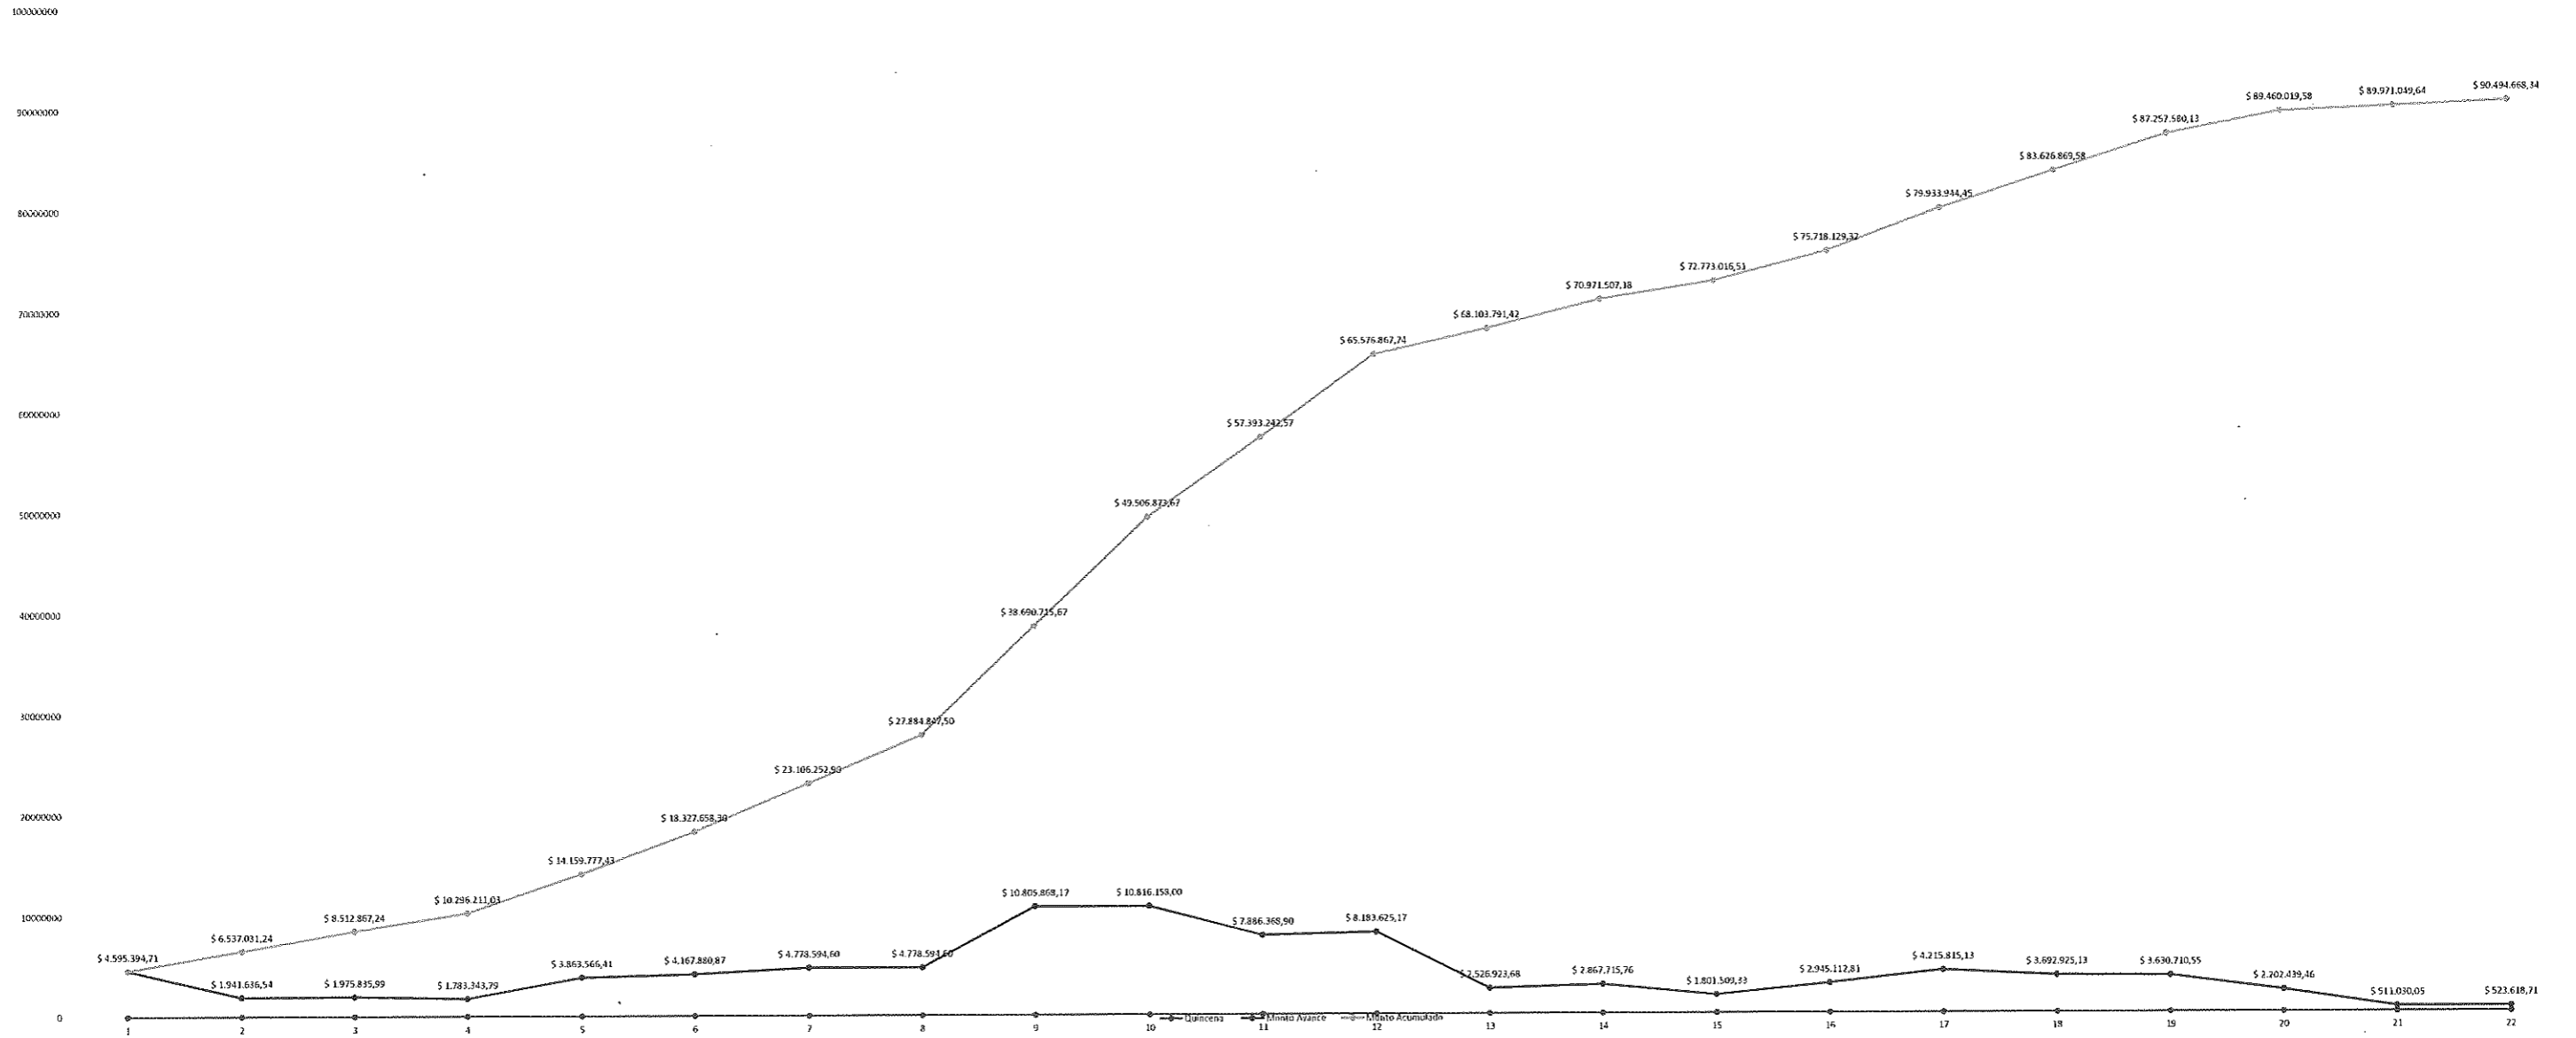

Ing. EDUARDO BARTOLOME OTERO MACHADO
 REPRESENTANTE TECNICO
 ALTOTE S.A.-NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.

Arq. Eduardo Curiel
 Mat. -CRAU 91
 IF-2019-09176926-GCABA-DGORU

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 490/MAYEPGC/19 (continuación)

G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico**Número:** IF-2019-09176926-GCABA-DGORU

Buenos Aires,

Lunes 25 de Marzo de 2019

Referencia: curva de inversión Adicional Ex Felinera

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.03.25 10:14:56 -03'00'

Antonella Carucho

Asesor legal

D.G. OBRAS DE REGENERACION URBANA (MAYEPGC)

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO

FIN DEL ANEXO

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales

DN: cn=Comunicaciones Oficiales

Date: 2019.03.25 10:14:57 -03'00'
